PROJECT MANAGEMENT

by Nabil MAAZOUZI

Règles *d'OR*



- Réglez vos téléphones sur NE PAS déranger
- Merci de respecter le temps de pause
- Respectez les opinions individuelles et les diversités
- Il n'y a pas de question stupide
- Un intervenant à la fois

KEEP CALM & PARTICIPATE !

Parcours Personnel

10 années d' expériences, dont **6 ans** chez Capgémini

Président d'une association sportive à Paris

Arbitre de District (Football)



Papa d'un petit garçon de 18 mois



PARCOURS PROFESSIONNEL

1 FEDERIS
2014-2015 : Développeur

2 Caisse des Dépôts
2015-2016 : Consultant BI

3 BNP Paribas PF
2016-2017 : Tech Lead BI

4 BforBank
2017-2018 : Business Analyst

5 Agence Française de Développement
2018-2019 : Product Owner

6 ORANGE
2019-2022 :Engagement Manager (adjoint)

7 DG des Finances Publiques
2022-2023 : Engagement Manager

8 Ambitions 2027
2027 : Engagement Director


9 Ambitions 2030
2030 : Delivery Partner

[...]

Votre introduction en 1 minute



Nom - Prénom

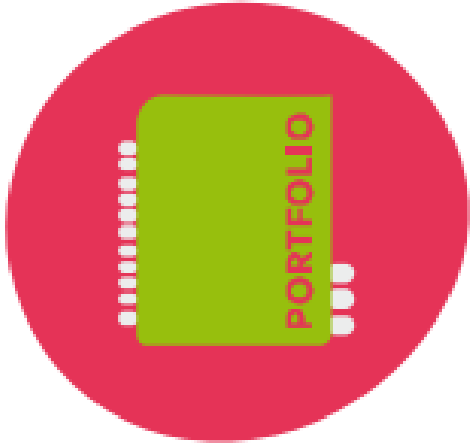

Parcours scolaire



Film/Hobby favori

Agenda

23/01 : 14h à 18h - Cour Magistral n°1

30/01 : 14h à 18h - Cour Magistral n°2

13/02 : 14h à 16h - TP n°1 Groupe A
13/02 : 16h à 18h - TP n°1 Groupe B

27/02 : 14h à 18h - Cour Magistral n°3

7/03 : 14h à 16h - TP n°2 Groupe B
7/03 : 16h à 18h - TP n°2 Groupe A

19/03 : 14h à 18h - Cour Magistral n°4

26/03 : 14h à 16h - TP n°3 Groupe A
26/03 : 16h à 18h - TP n°3 Groupe B

Agenda

08/04 : 14h à 18h - Projet d'étude

09/04 : 14h à 18h - Projet d'étude

15/04 : 14h à 18h - Projet d'étude

16/04 : 14h à 16h - TP n°4 Groupe B
16/04 : 16h à 18h - TP n°4 Groupe A

23/04 : 14h à 18h - Préparation à la soutenance

30/04 : 14h à 18h - Remise de dossier

07/05 : 09h à 18h - Soutenance de projet

Quelles sont vos attentes à l’égard de ce cours ?




Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de projet.

Acquérir les compétences nécessaires pour planifier, exécuter et contrôler un projet.

Apprendre à gérer les ressources, les délais et les coûts d'un projet.

Développer des compétences en communication et en leadership pour diriger une équipe de projet.

Comprendre les risques et les problèmes courants rencontrés dans la gestion de projet et apprendre à les résoudre.



Objectifs du Cours

5 étapes à acquérir

SOMMAIRE

I. Introduction à la gestion de projet
II. Les principes fondamentaux de la gestion de projet
III. Les différentes phases d'un projet
IV. Rôles et compétences du chef de projet
V. Les principes du chef de projet
VI. Les méthodes de la gestion de projet
VII. Outils de la gestion de projet
VIII. Conduite de changement
IX. Numérique responsable

I. INTRODUCTION

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

1. Qu'est-ce qu'un projet ?



2. Qu'est-ce que la gestion de projet ?



3. Importance de la gestion de projet dans les organisations



A. Définition de la gestion de projet


1. What is a Project ?

- **“A unique set of activities meant to produce a defined outcome within an established time framing specific allocation of resources.”** (***Harvard Business Review***)

- **“A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product or service.”** (***Project Management Institute***)





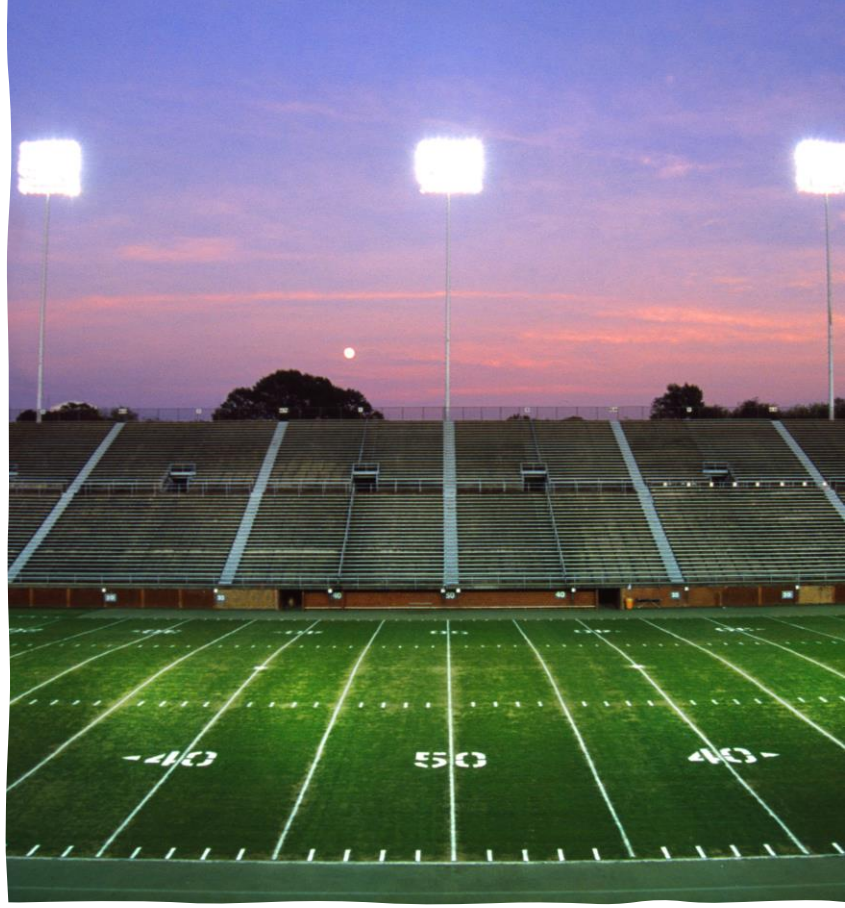

1. Qu'est-ce qu'un projet ?

Exemples de type de projets :


- **Production unitaire** : mobilisation des ressources d'une entreprise pour un projet d'une durée assez longue
  - Ouvrage d'art, bâtiment
  - Construction d'un stade, construction navale

Activités de gestion non répétitives

- Lancement d'un nouveau produit
- Investissement
- Réorganisation administrative


1. Qu'est-ce qu'un projet ?

Projet = réponse à une expression de besoins souvent difficiles à cerner et à concrétiser

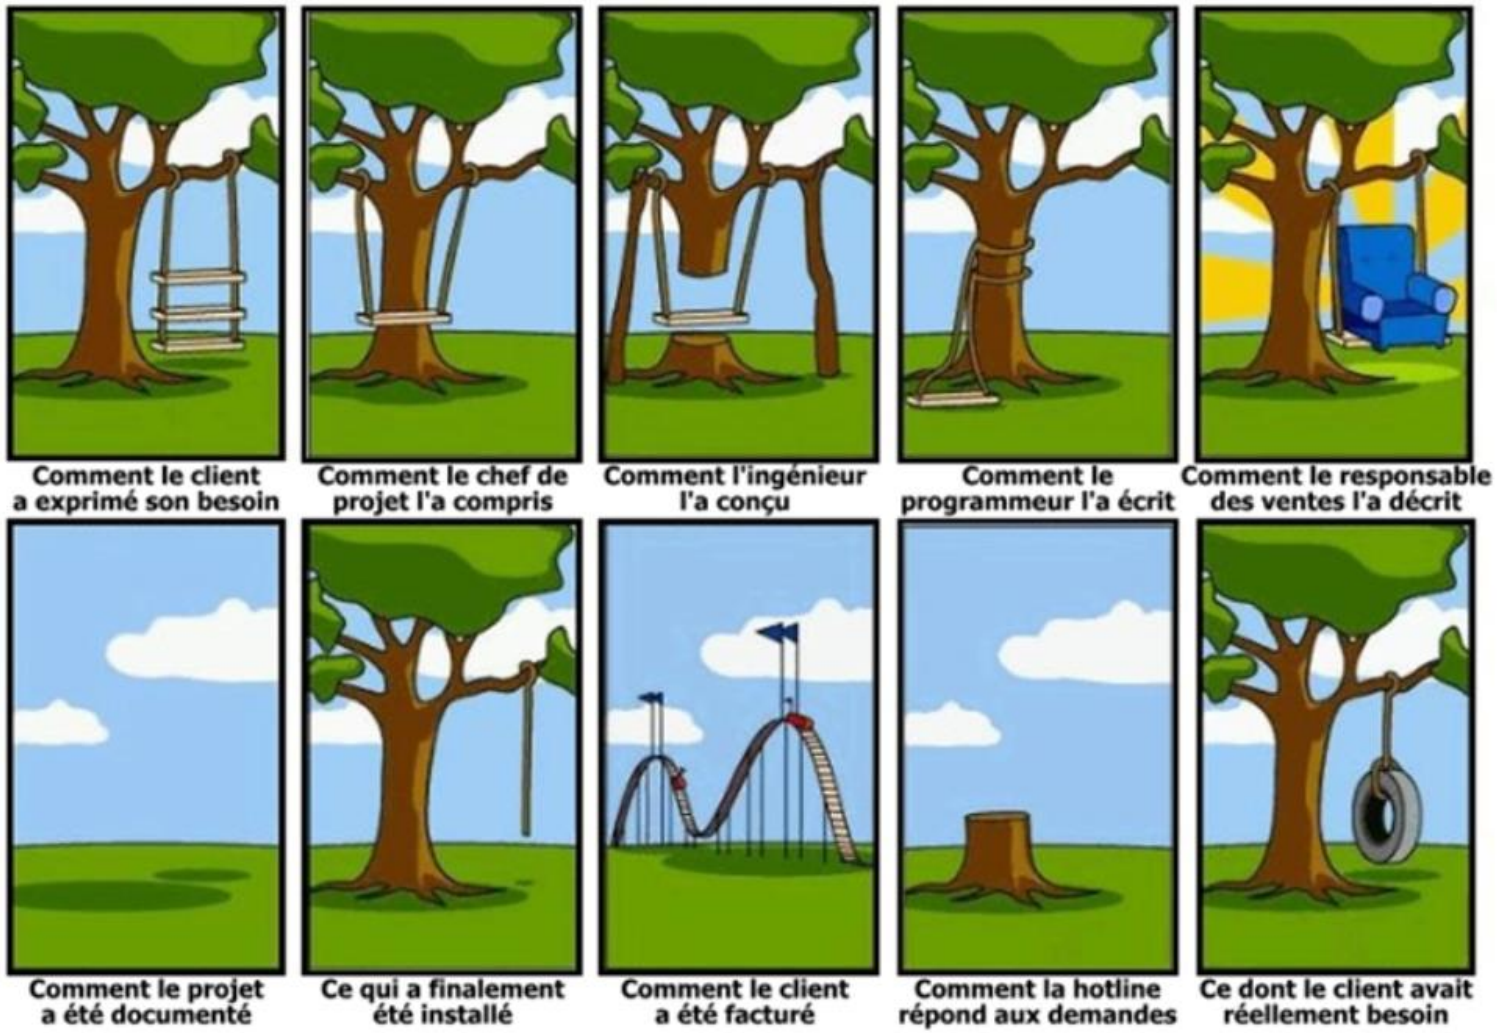

2. What is not a Project ?



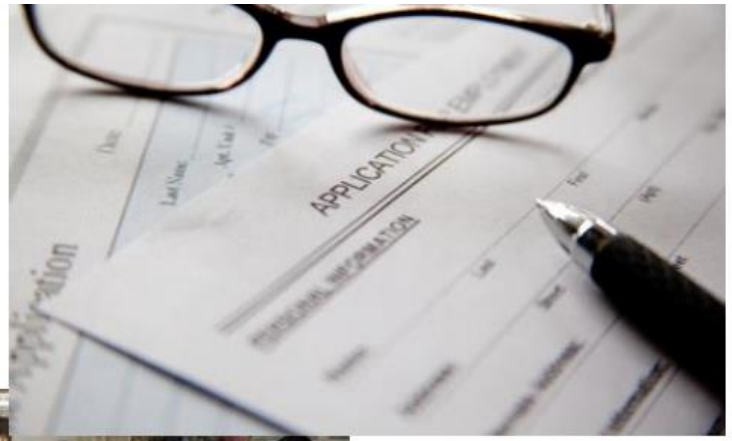



Projet VS Production

Projet	Production
Unique	Répétitive
Fini	En cours
Décisions irréversibles	Décisions périodiques
Incertitude forte	Incertitude faible
Mesuré en valeur	Mesuré en volume
Proposé pour atteindre l'objectif	Proposé pour soutenir l'entreprise

3. Les caractéristiques d'un projet

Adaptable à des modifications fréquentes

Equilibre entre les contraintes techniques, économiques, et temporelles

Généralement novateur (technique, dimension, géographie, procédé…)


Non répétitif et qui nécessite une organisation spécifique et temporaire

Début et fin propre

Tourné vers l'**objectif** final

4. Les composants d'un projet

- Un objectif, souvent contractuel
- Des critères de réalisation (coûts, délais, qualité, …)
- Un budget propre
- Un échéancier avec des dates de réalisation
- Un responsable et son équipe
- Un système de gestion permettant l'accès à l'information et la prise des décisions

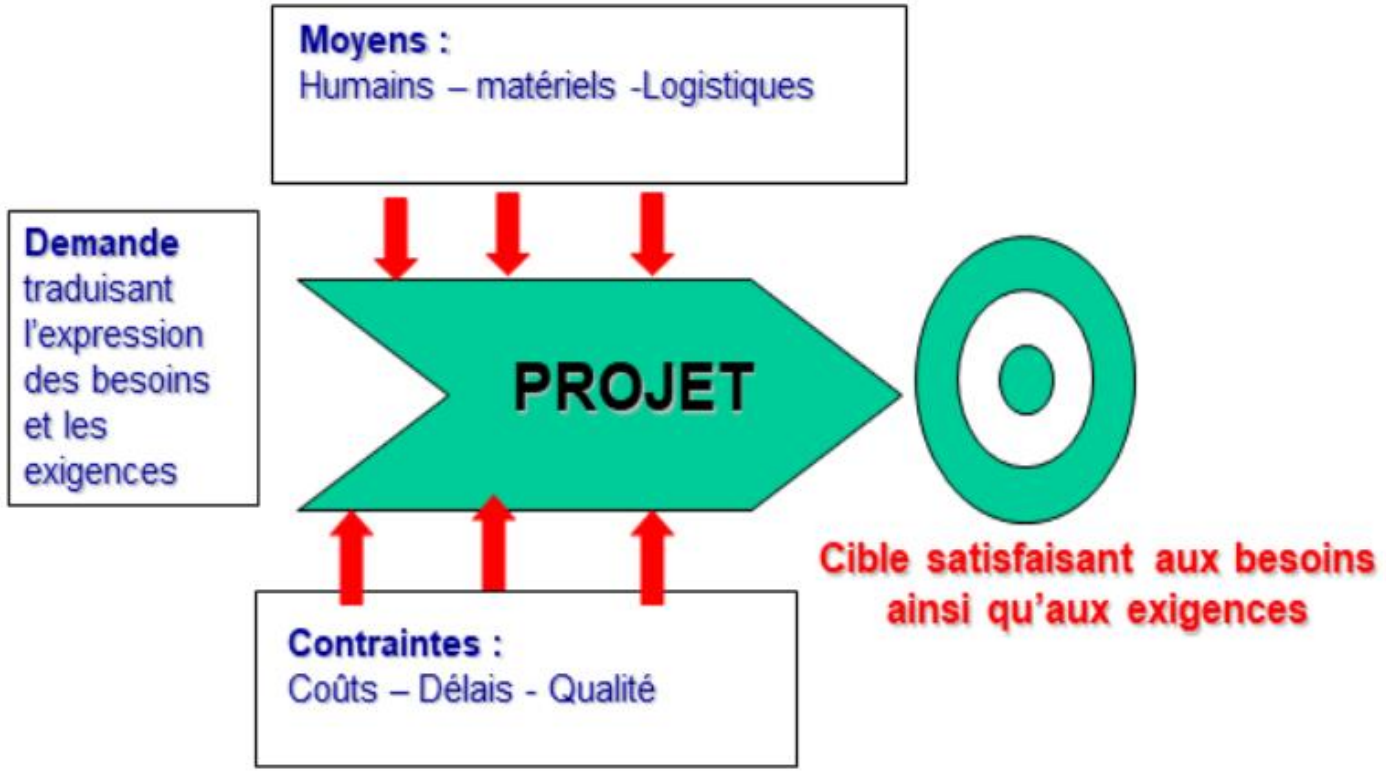

5. L’objectif d’un projet


La méthodologie SMART

S — Spécifique



- Quel est l'objectif précis que je veux atteindre ?
- Qu'est-ce que je veux accomplir exactement ?
- Qui est impliqué dans cet objectif ?

M — Mesurable



- Comment vais-je mesurer mon progrès vers cet objectif ?
- Quels indicateurs ou critères vais-je utiliser pour évaluer ma réussite ?
- Quelle est la quantité ou la qualité que je veux atteindre ?

A — Atteignable



- Est-ce que cet objectif est réaliste et réalisable ?
- Ai-je les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif ?
- - Est-ce que cet objectif est aligné avec mes compétences et mes capacités ?

R — Réaliste



- Est-ce que cet objectif est réalisable dans les contraintes de temps et de ressources disponibles ?
- Est-ce que cet objectif est en accord avec mes valeurs et mes priorités ?
- Est-ce que cet objectif est réalisable compte tenu des circonstances actuelles

T — Temporellement défini



- Quel est le délai ou la date limite pour atteindre cet objectif ?
- Quand est-ce que je veux avoir accompli cet objectif ?
- Est-ce que cet objectif est réalisable dans le temps imparti ?

En vous posant ces questions, vous pourrez définir des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis) qui vous aideront à clarifier vos intentions, à mesurer votre progrès et à atteindre vos objectifs de manière efficace.


II. Les principes fondamentaux de la gestion de projet


INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET


C'EST POURTANT CLAIR...
?
PAR ICI
PAR LÀ
PAR LÀ
C'EST PAR LÀ
PAR ICI
WWW.LEADERSHEEP.NET

1. Définition de la gestion de projet

Est une action temporaire avec un début et une fin, qui mobilise des ressources identifiées (humaines, matérielles, équipements, matières premières, informationnelles et financières) durant sa réalisation en vue d'atteindre ou de dépasser les attentes des parties impliquées dans le projet.

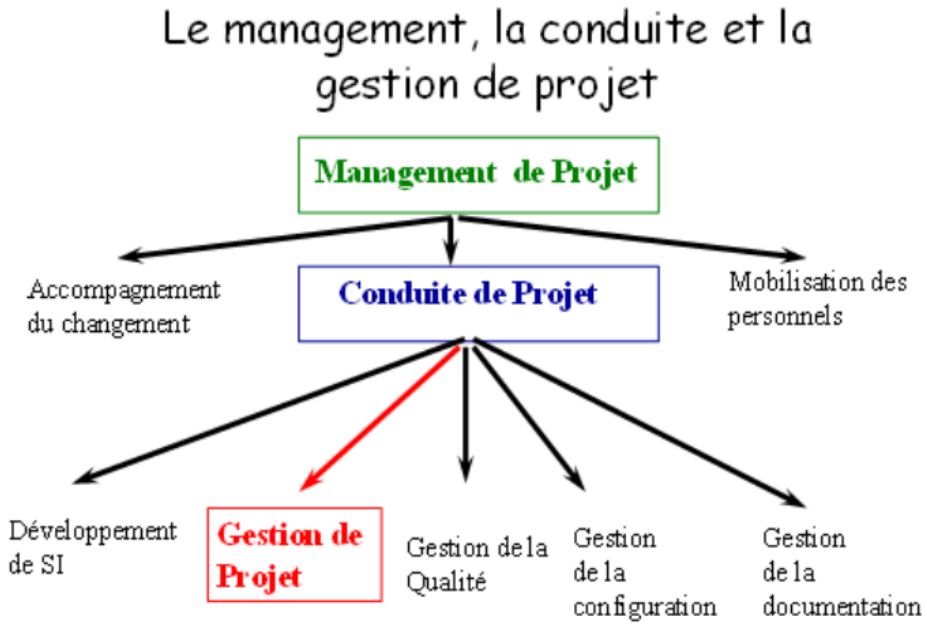

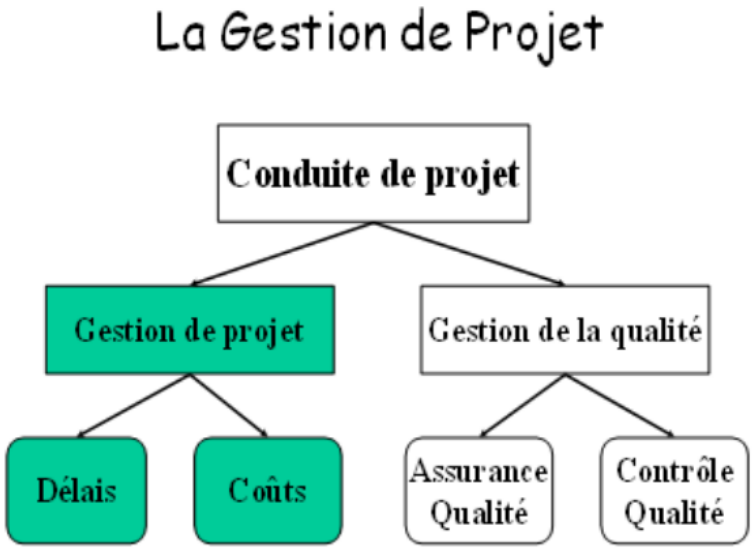

2 Triangle d’or de la gestion de projet



TIME

Les délais font référence à la durée nécessaire pour réaliser le projet. Il s'agit du temps alloué pour accomplir les différentes tâches et atteindre les objectifs fixés.

COST

Le coût fait référence aux ressources financières nécessaires pour mener à bien le projet. Il englobe les dépenses liées aux matériaux, à la main-d'œuvre, aux équipements, etc.

SCOPE

Le périmètre fait référence à l'étendue et à la portée du projet. Il définit les objectifs, les livrables et les fonctionnalités attendues.

QUALITY

La qualité du projet est donc le résultat de l'équilibre entre ces trois éléments du triangle d'or.

ASAP or ALAP?


	Cost	Time
As Soon as Possible	✗	✓
As Late as Possible	✓	✗

3. Les parties prenantes d’un projet

Les parties prenantes sont les personnes qui ont un intérêt quelconque dans le résultat de votre projet. Il s’agit :

- **Client** : utilisateur direct d'un produit ou d'un service, souvent à la fois interne et externe à l'entreprise qui exécute le projet
- **Chef de projet** : personne qui dirige le projet
- **Membres de l'équipe du projet** : groupe qui exécute le projet sous la direction du chef de projet
- **Promoteur du projet (Sponsor)** : personne qui finance le projet
- **Comité directeur** : groupe consultatif qui donne des conseils pour les décisions clés. Il comprend le promoteur, les cadres et les principales parties prenantes de l'organisation
- **Cadres** : cadres supérieurs en charge de la stratégie de l'entreprise qui exécute le projet
- **Gestionnaires des ressources** : autres responsables qui contrôlent les ressources nécessaires à l'exécution du projet

4. Processus de la gestion de projet

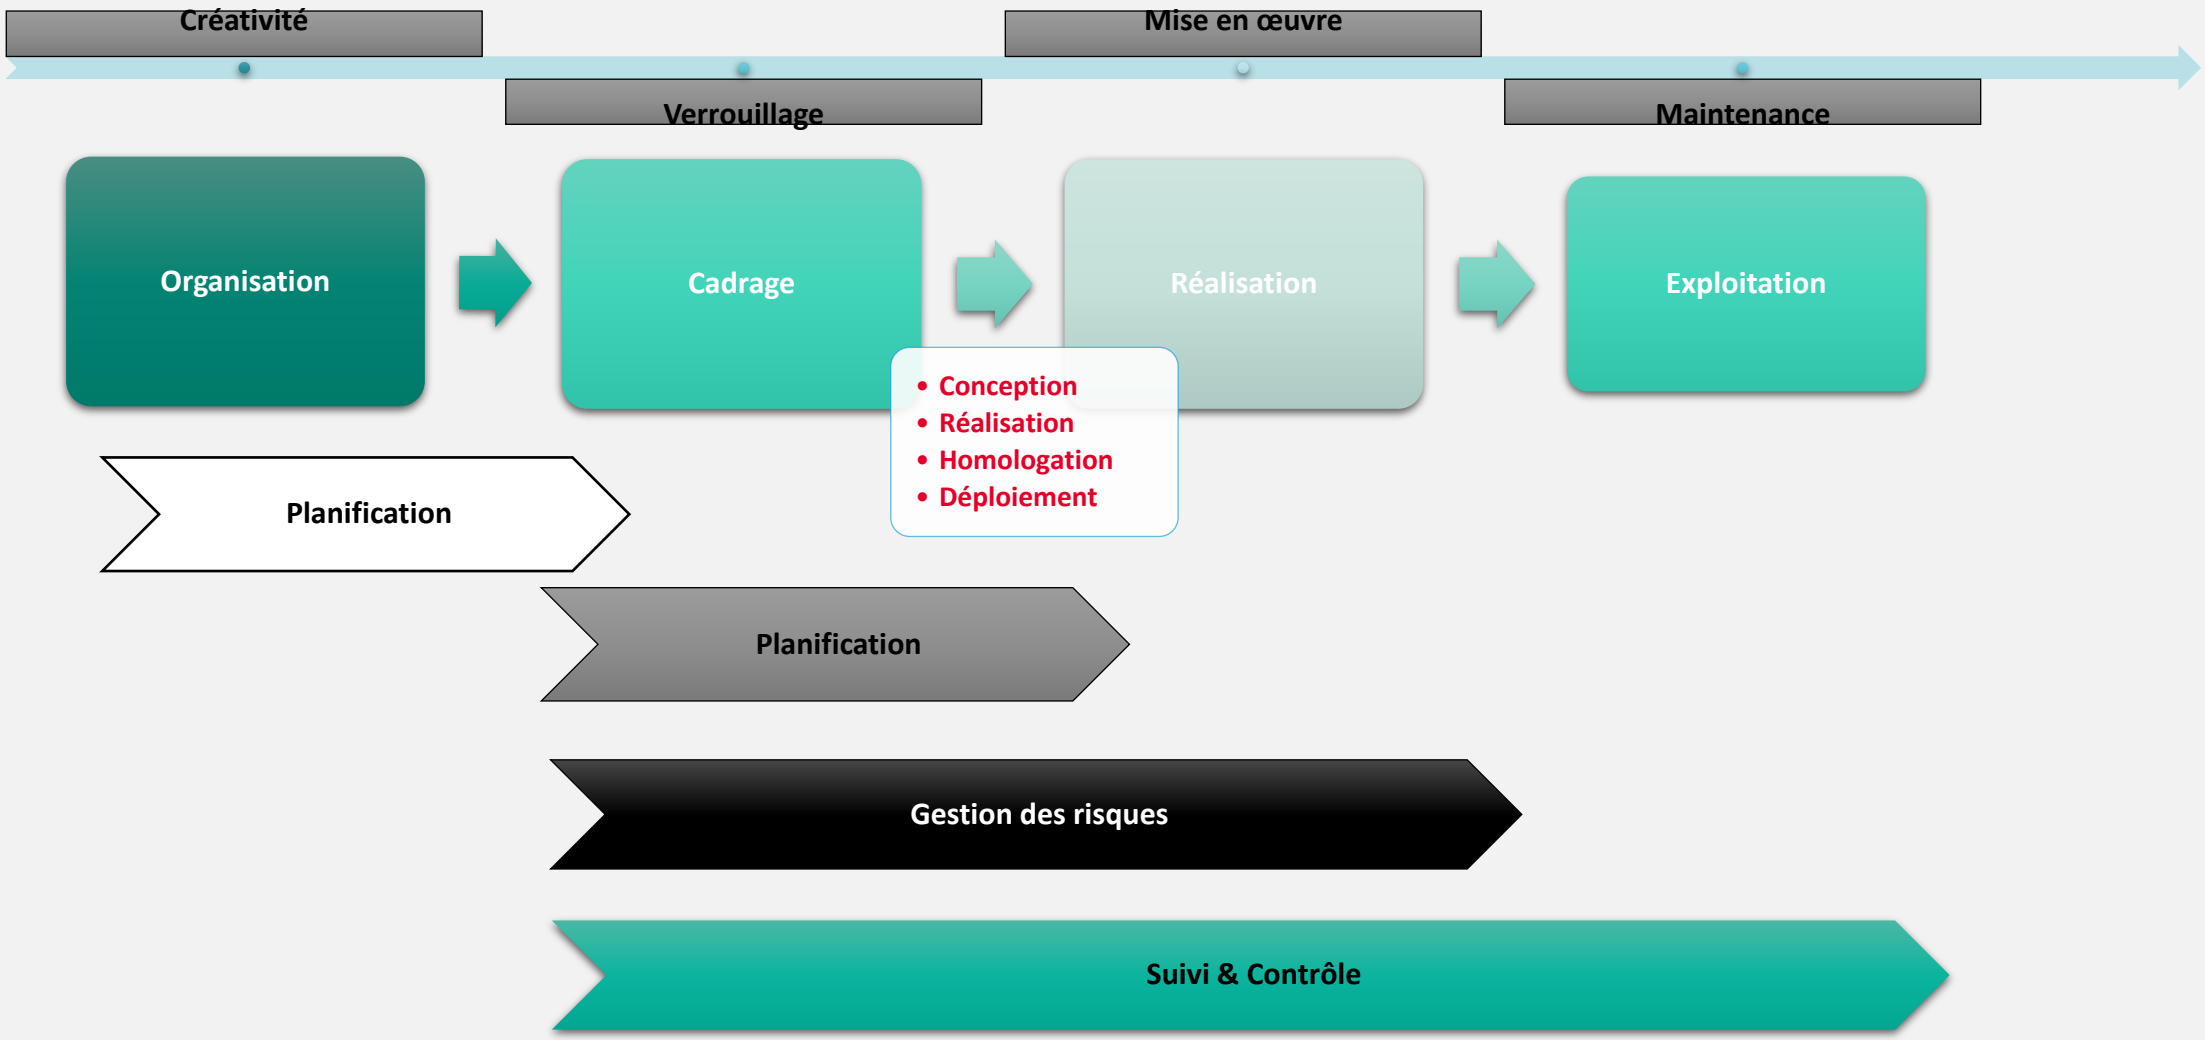

III. Les différentes phases d'un projet

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET

Quels sont les étapes du projet

01

Phase de préparation #01

l'étude de faisabilité, l'étude des besoins,

02

Phase de cadrage #02

le cahier des charges, le budget prévisionnel, le macroplanning,

03

Phase de conception #03

User story / Specifications fonctionnelles
Spécifications techniques

04

Phase de réalisation #04

Un produit, un prototype à tester, guide utilisateur, kit de COM,


05

Phase de cloture #05

Un produit final testé et validé !



Quels sont les livrables attendus à chaque étape du projet

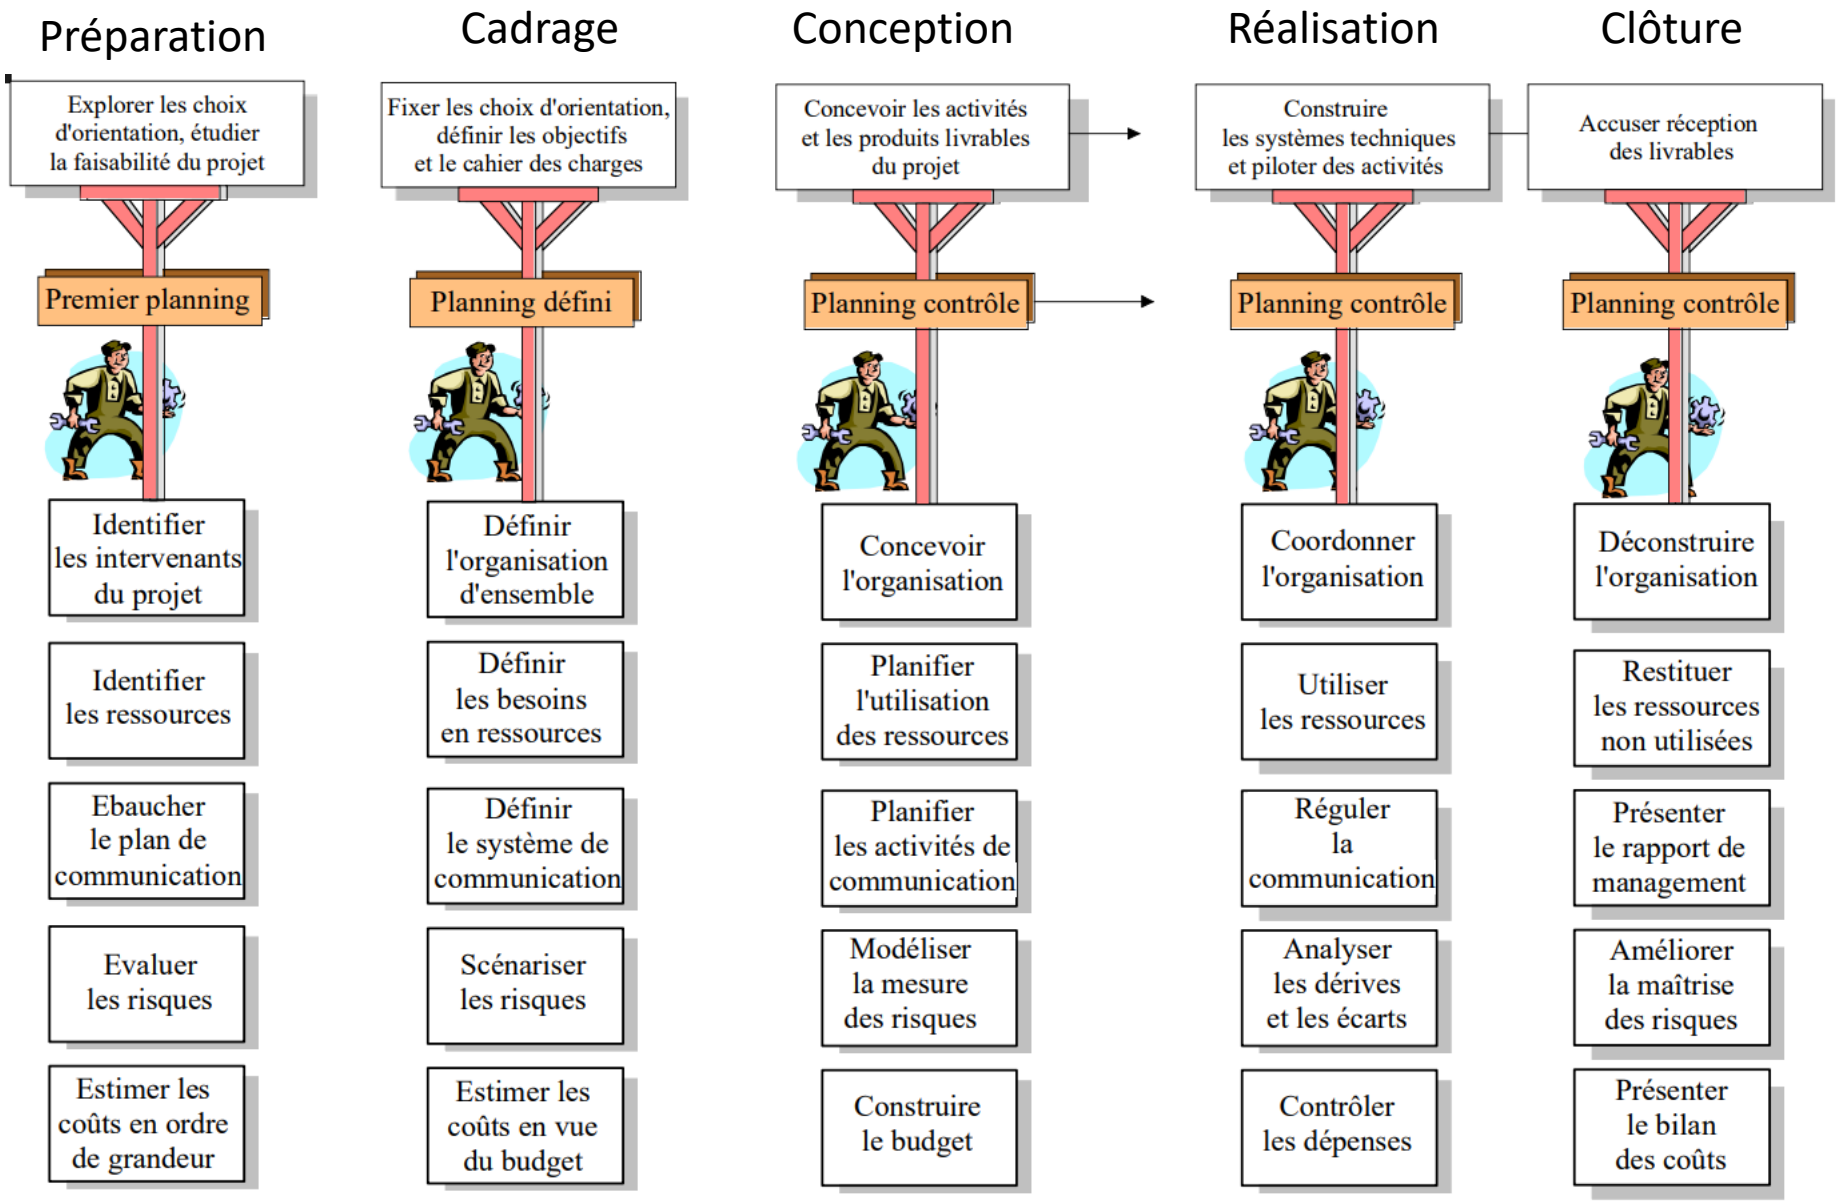




I. Phase de préparation /cadrage

Lancement du projet : identification d'un besoin ou d'un problème de l'entreprise et d'une solution potentielle.

- 1. Étude de faisabilité
- 2. Définition des objectifs et des livrables
- 3. Planification initiale du projet

1. Analyse du besoin / Étude de faisabilité

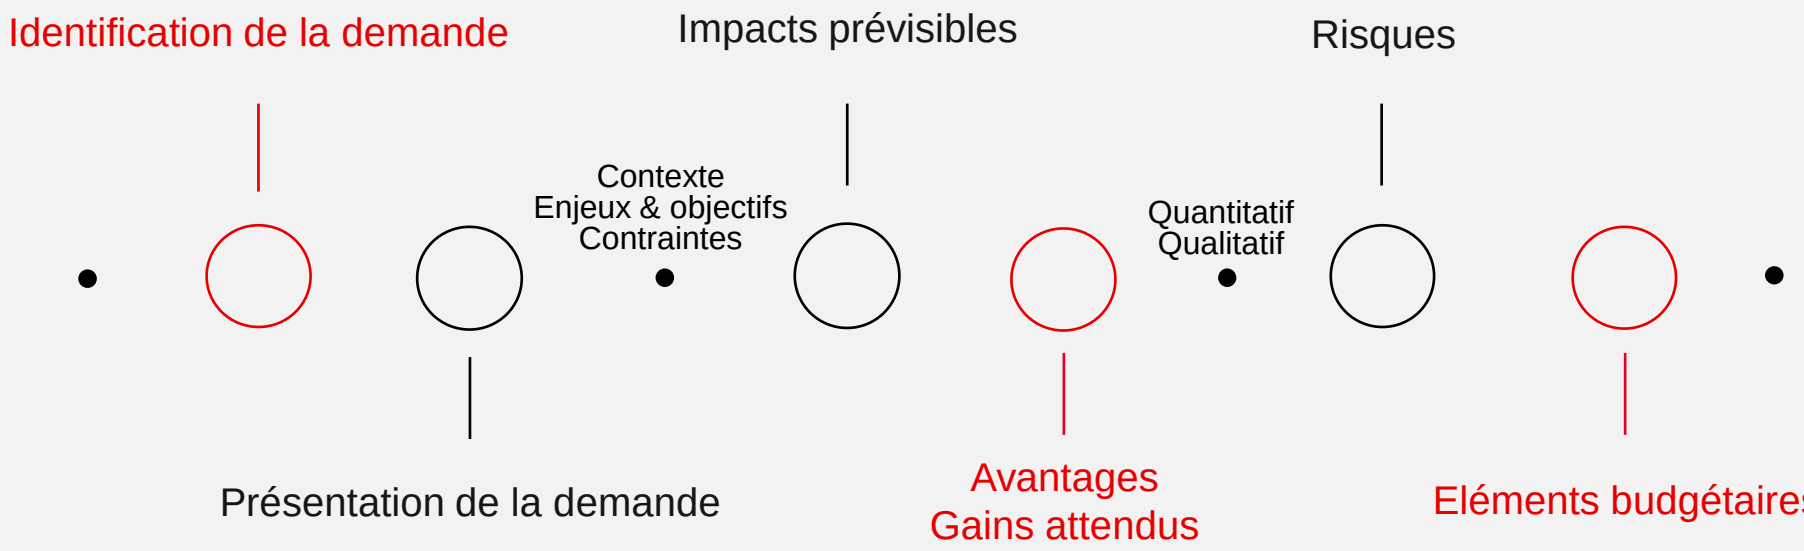


2.1 Définition des objectifs

Qu'appelle-t-on « objectifs de projet » ?

En bref, les objectifs de projet constituent la finalité de votre projet. Ils orienteront chaque décision prise au long du cycle de vie du projet, et c'est pourquoi il est si important de les clarifier autant que possible dès le premier jour.

- Spécifique (but)
- Mesurable (indicateur)
- Atteignable (étapes)
- Réaliste
- Temporel

2.2 Définition des livrables

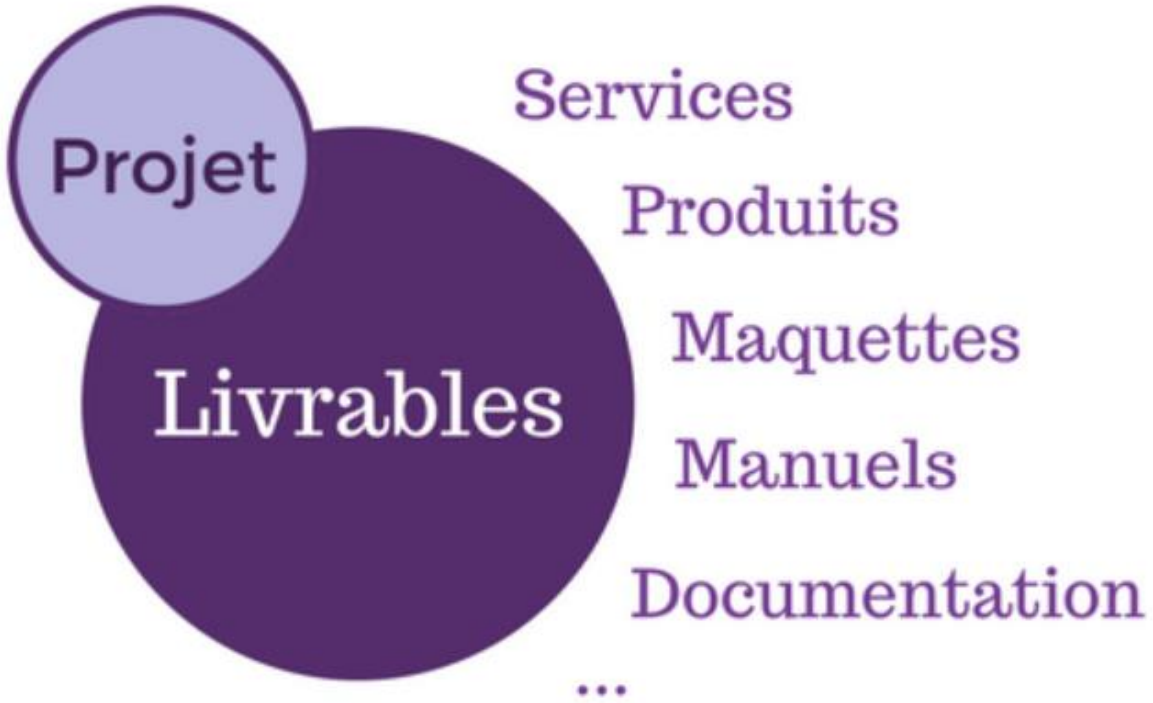

Définition de « livrables »

La conduite d'un projet débouche sur un produit, un service, une nouvelle organisation, etc. Cette finalité, appelée "livrable", est **le résultat tangible d'une production réelle, appréhendable, mesurable** attendue par le client final. Un projet peut, bien sûr, avoir plusieurs livrables.

Exemple de livrable

Destinés aux clients finaux	Propres au processus de gestion de projet
• Application logicielle • Produit physique : construction, machine, procédé... • Maquette fonctionnelle • PV de recette • Rapports d'audit • Rapports d'étude • Documentation et modes d'emploi • Plan de formation	• Plan projet • Étude de faisabilité • Étude de risques • Plan de communication • Plan d'assurance qualité • Appel d'offres • Note de cadrage • Compte rendu • Support de présentation

3. Planification initiale du projet

Input :

- Identifier les contraintes du client
- Délimiter le périmètre fonctionnels et techniques du projet
- Lister l'ensemble des livrables
- Découper le périmètre et définir la priorité des tâches
- Estimer la capacité de production de l'équipe (congés, formations…)


Contenu :

- Jalons clés à définir/valider avec le client
- Délai de livraison
- Dates au plus tôt/plus tard
- Gestion des dépendances internes et externes du projet
- Périmètres fonctionnels et techniques
- Risque : marge contingence

Outputs :

- Valider et partager le planning avec les différentes parties prenantes

Exemple de roadmap (feuille de route)

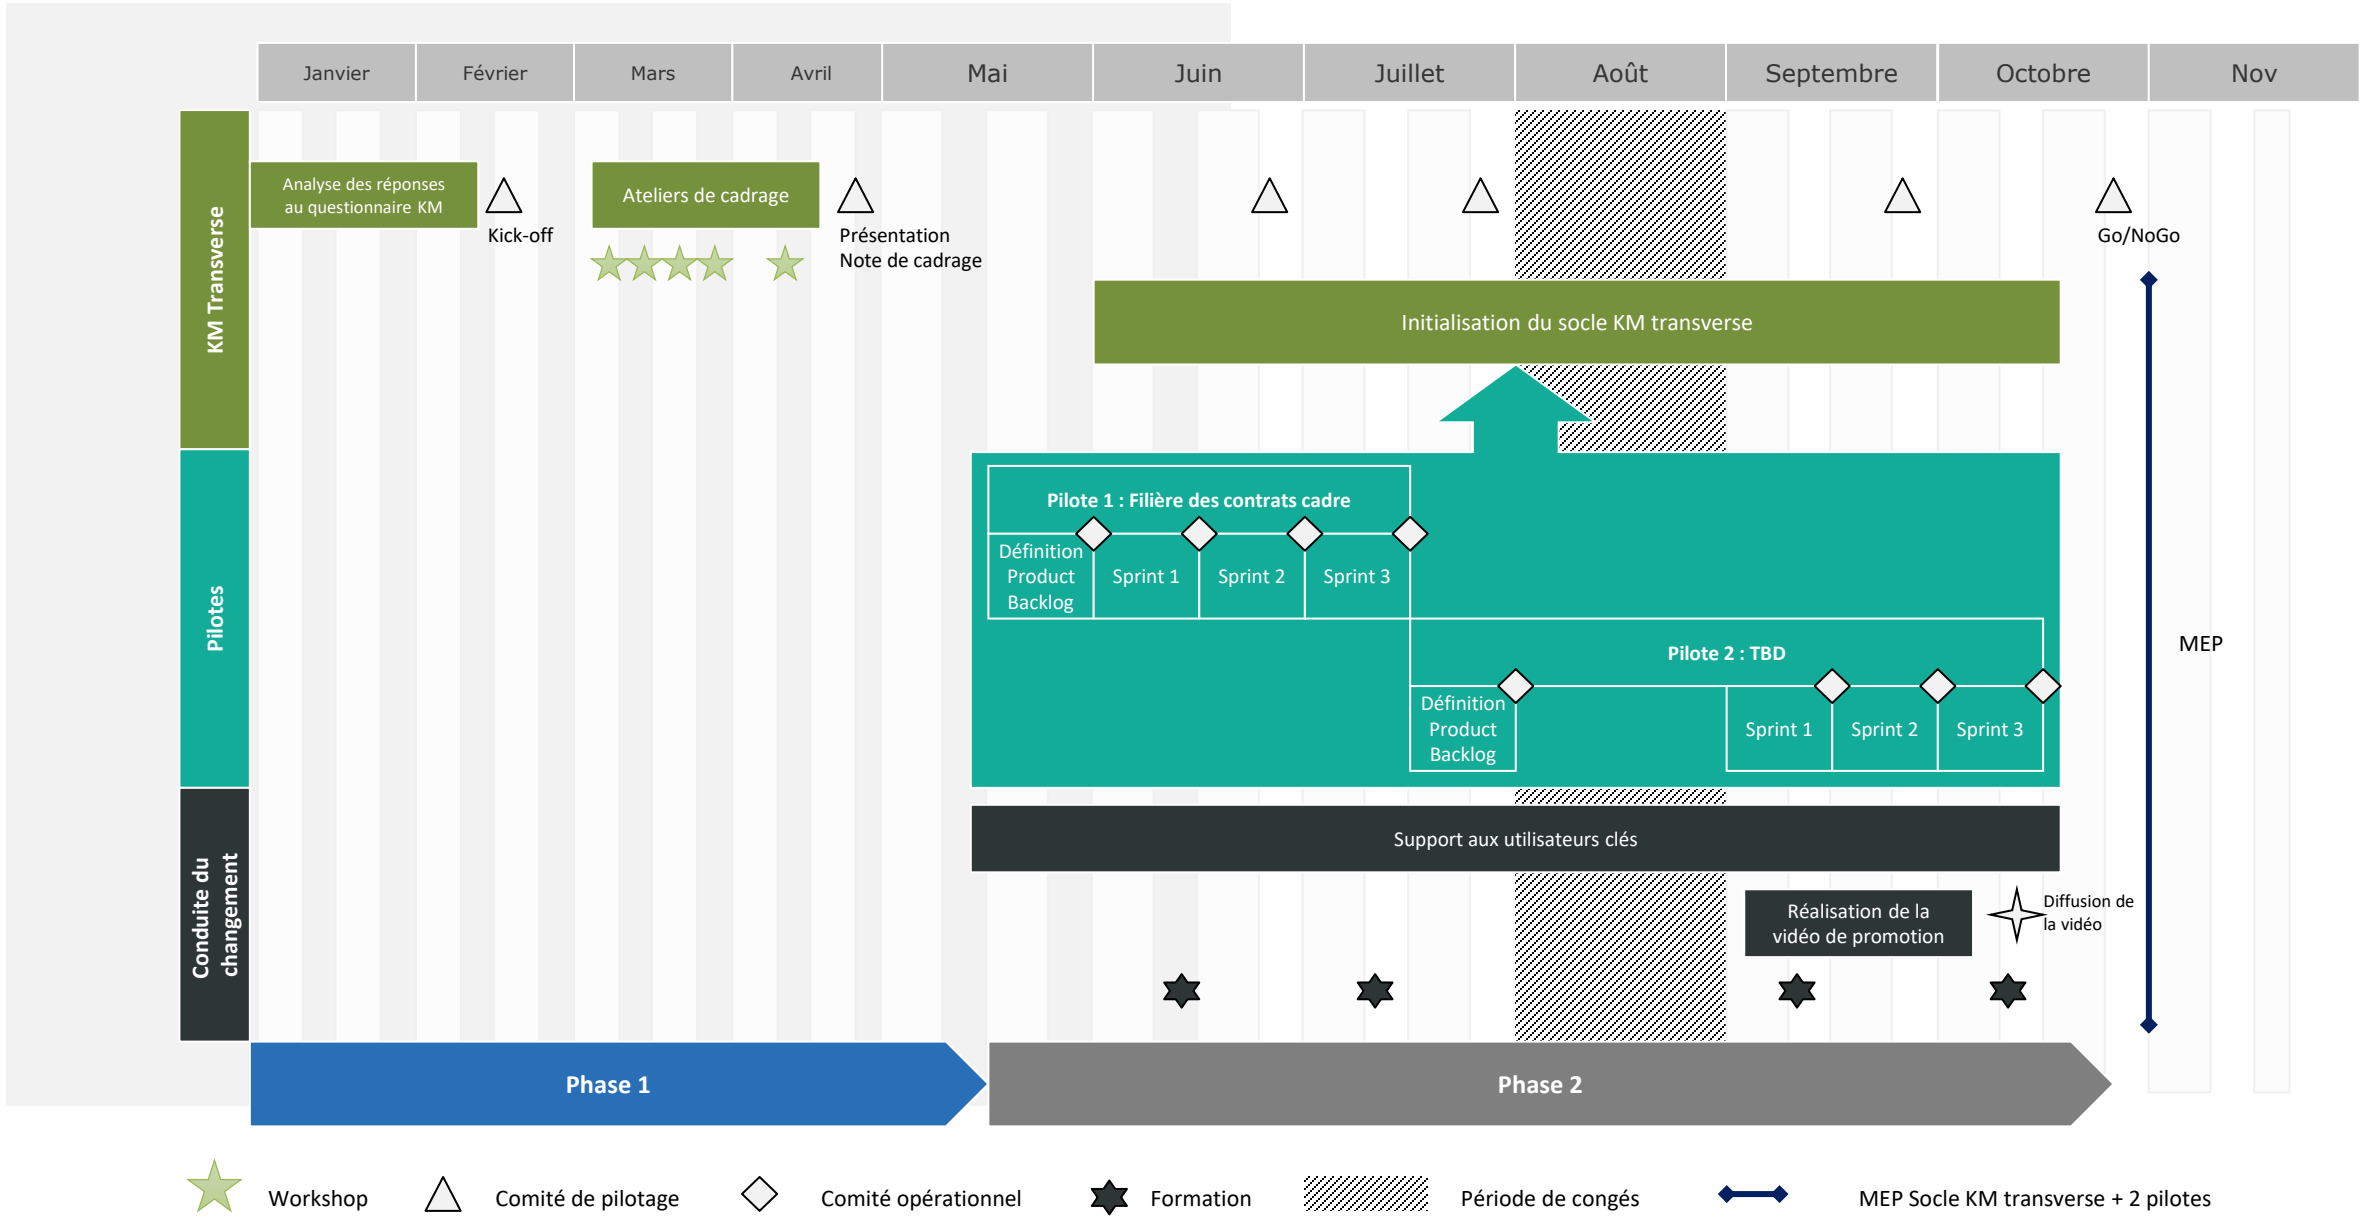



II. Phase de conception

Planification du projet : définition des tâches spécifiques, attribution des responsabilités et élaboration du plan détailler du projet.

- 1. Élaboration du plan détaillé du projet
- 2. Identification des ressources nécessaires
- 3. Répartition des tâches et des responsabilités

1. Élaboration d'un plan détaillé du projet

Qu'est-ce qu'un plan de projet ?

- Un plan de projet est un document formel qui décrit l'intégralité des ambitions et des objectifs d'un projet, les tâches spécifiques et les conditions de sa réussite.
- Outre la définition de l'objectif de votre projet, il doit inclure d'autres documents et produits livrables pertinents pour le projet tels que :
- **Des calendriers et des diagrammes de Gantt pour les étapes clés**, comme les dates de début et de fin, l'obtention de votre 200e client ou le lancement d'un événement ou d'une application.
- **Des plans de communication** pour tenir tout le monde informé des progrès effectués, des réalisations obtenues et des obstacles potentiels.
- **Une structure de répartition du travail** (WBS pour « Work Breakdown Structure » en anglais), en particulier si plusieurs membres de l'équipe travaillent sur des tâches différentes ou simultanées, auquel cas vous pouvez également avoir besoin d'un planificateur de projet.
- **Les ressources nécessaires** pour mener à bien le projet, comme les outils de gestion de projet, les liquidités, les travailleurs indépendants, etc

2. Identification des ressources nécessaires

Pour qu'un projet puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'identifier avant même que celui-ci ne débute, les ressources indispensables à sa réussite.

- **Les ressources humaines :** Il s'agit tout simplement de l'ensemble des personnes qui vont intervenir sur le projet, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise.
- **Les ressources financières :** Elles font référence au budget global du projet. Autrement dit, l'ensemble des coûts et des dépenses qui peuvent intervenir tout au long du projet : le salaire de l'équipe, la location ou l'achat de matériel, les frais de déplacement…
- **Les ressources matérielles** : Concernent tout ce dont l'équipe projet va avoir besoin pour mener à bien le projet : les salles, les équipements informatiques, les logiciels…

3. Répartition des tâches et des responsabilités

Quel est l'intérêt de la répartition des tâches dans une équipe ?

- La répartition des tâches dans une équipe présente de nombreux avantages pour une équipe. Elle permet une meilleure utilisation des compétences individuelles en assignant les tâches aux membres les plus qualifiés pour les accomplir. Cela conduit à une augmentation de l'efficacité et de la productivité globales de l'équipe. De plus, en répartissant équitablement les responsabilités, chaque membre de l'équipe se sent valorisé et impliqué, ce qui renforce la motivation et l'engagement.

- Une répartition claire des tâches dans une équipe évite également les doublons et les malentendus, ce qui favorise une coordination fluide et réduit les risques d'erreurs.

- Rien ne sert de courir, il faut s’organiser à point !

- La répartition des tâches au sein d'une équipe est un élément essentiel pour garantir l'efficacité et la réussite des projets. Lorsque les tâches sont bien réparties, chaque membre de l'équipe sait exactement ce qui est attendu de lui, ce qui permet de minimiser les confusions et les retards. Les quatre piliers de la cohésion d'équipe, à savoir une vision commune, l'esprit d'équipe, une communication éclairée et une évolution collective, jouent un rôle clé dans la réussite de cette répartition des tâches.



III. Phase de réalisation

C’est l’éxécution du projet : prise de contact avec les gestionnaires des ressources, surveillance du calendrier et du budget, compte rendu aux parties prenantes.

- 1. Suivi de l'avancement du projet
- 2. Gestion des risques et des problèmes
- 3. Coordination des différentes parties prenantes

1. Suivi de l'avancement du projet

Le suivi d’avancement se surnomme aussi “contrôle des tâches” ou “des activités du projet”. Il a pour but de vérifier que :

- le projet se déroule conformément au planning établi ;
- les ressources humaines, matérielles et financières sont bien définies ;
- celles-ci sont utilisées à bon escient.
- En cas de problème, ce contrôle vous fournit les données dont vous avez besoin pour le signaler à l’équipe. Vous pouvez alors prendre des mesures rapides pour résoudre le problème.

Le suivi de l’avancement du projet se divise en trois étapes :

- la collecte des données ;
- l’analyse de ces données ;
- la mise en place d’actions correctives, si besoin.

Le suivi peut donc être effectué de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle ou encore saisonnière.

2. Gestion des risques et des problèmes

A. Définition de la gestion des risques projet

- Un risque, c'est un événement futur possible, identifiable et que nous pouvons quantifier en gestion de projet.

- Le risque est inhérent à tout projet. Il peut provenir de la nature du projet, des budgets alloués, du degré de complexité, du besoin en ressource, etc.


B. Importance de la gestion des risques dans la réussite d'un projet Identification des risques

- Anticipation des problèmes

- Réduction des impacts négatifs

- Optimisation des ressources

- Amélioration de la communication

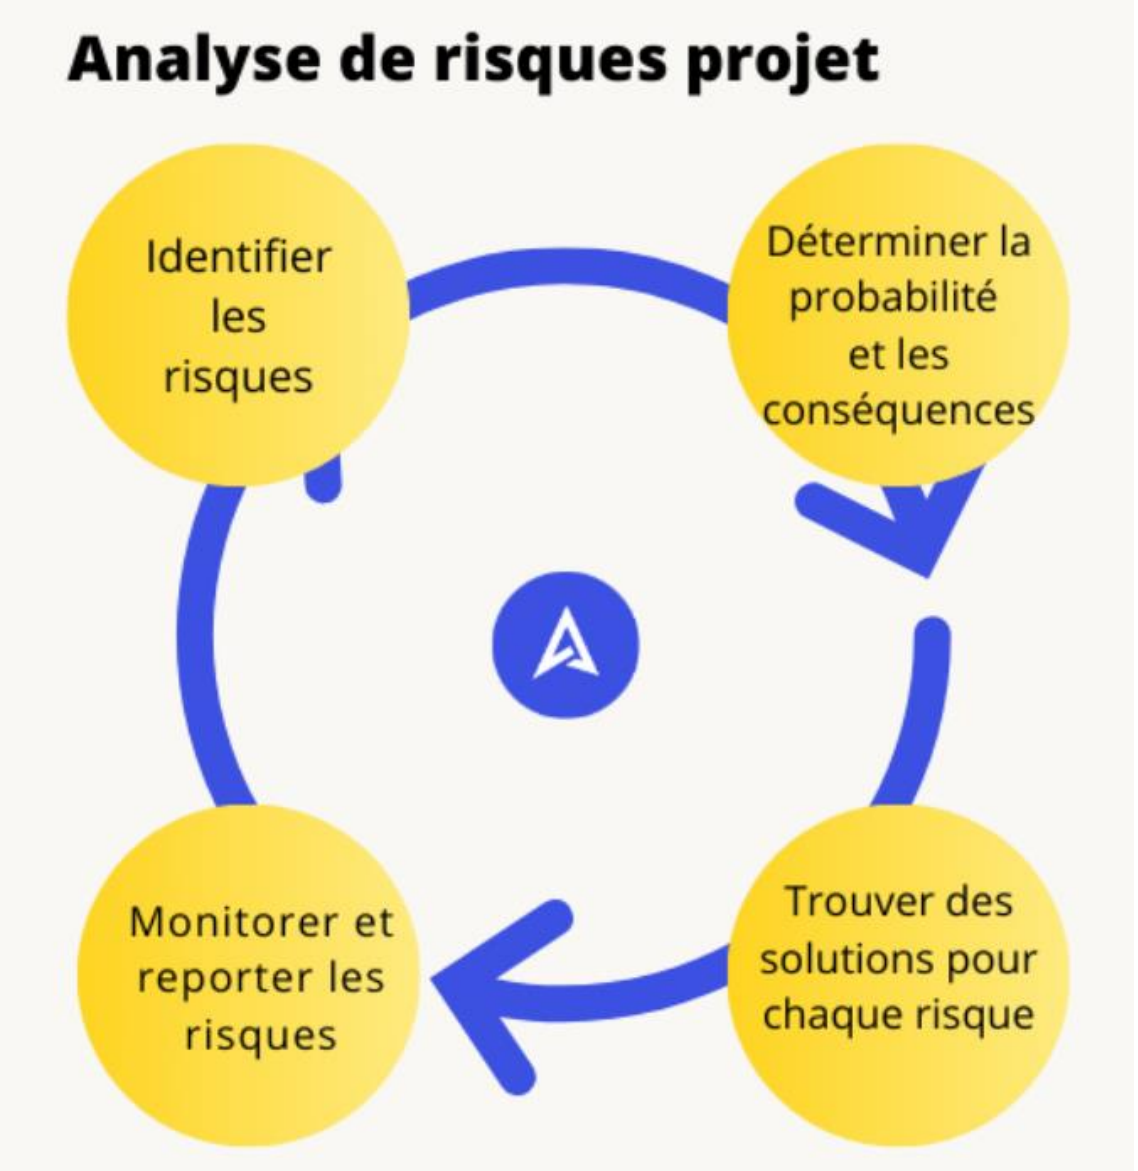

Rappelez-vous la formule inventée par Olivier Bas, vice président du groupe Havas

½ décision

= bordel²



3. Coordination des différentes parties prenantes

1. Introduction à la coordination des parties prenantes :

La coordination des parties prenantes est un processus essentiel dans la gestion de projet. Les parties prenantes sont toutes les personnes ou les organisations qui sont directement ou indirectement affectées par le projet, ou qui ont un intérêt dans le projet. La coordination des parties prenantes vise à établir et à maintenir des relations efficaces avec ces parties prenantes afin de garantir leur participation active et leur soutien tout au long du projet

2. Identification et gestion des parties prenantes :

La première étape de la coordination des parties prenantes consiste à identifier toutes les parties prenantes potentielles. Cela peut inclure les clients, les membres de l'équipe projet, les fournisseurs, les utilisateurs finaux, les autorités réglementaires, les groupes d'intérêt, etc. Il est important d'identifier toutes les parties prenantes dès le début du projet afin de pouvoir les impliquer et les consulter tout au long du processus.

- Analyse des parties prenantes
- Communication et collaboration
- Gestion des conflits



IV. Phase de clôture

La phase de Clôture du projet est la dernière étape du cycle de vie d'un projet. Elle vise à finaliser toutes les activités restantes,

- 1. Vérification de la conformité des livrables
- 2. Évaluation des résultats du projet
- 3. Bilan et retour d'expérience

1. Vérification de la conformité des livrables

Lors de la phase de clôture, il est important de vérifier que tous les livrables du projet ont été produits conformément aux spécifications et aux exigences définies. Cela implique de comparer les livrables avec les critères de qualité et de performance préalablement établis. Si des écarts sont identifiés, des mesures correctives peuvent être prises pour les résoudre.

2. Évaluation des résultats du projet

L'évaluation des résultats du projet permet de mesurer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Cela implique de comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés en termes de coûts, de délais, de qualité et de performance. Cette évaluation permet de déterminer si le projet a été un succès et de fournir des informations pour les projets futurs.

3. Bilan et retour d'expérience

Le bilan et le retour d'expérience sont des éléments clés de la phase de clôture d'un projet. Le bilan consiste à dresser un inventaire de toutes les activités réalisées, des problèmes rencontrés, des décisions prises et des leçons apprises tout au long du projet. Le retour d'expérience consiste à analyser ces informations et à en tirer des enseignements pour améliorer les pratiques et les processus pour les projets futurs.

IV. CONCLUSION

Conclusion



Points clés évoqués dans le cours #01

Importance de la gestion de projet dans le monde professionnel #02

Recommandations pour approfondir ses connaissances en gestion de projet #03

LES 4 PHASES DU MANAGEMENT DE PROJETS

PHASE 1
ANALYSE DES BESOINS

Phase d'**analyse des besoins** et de lancement du projet.

ANALYSER LES BESOINS



- Identifier les besoins
- Valider la faisabilité et l'opportunité du projet
- Estimer les ressources nécessaires
- Identifier les personnes-clés du projet

DEFINIR LES OBJECTIFS



- Définir le ou les objectifs du projet
- Nommer le projet
- Initier le démarrage officiel du projet (réunion de lancement)

OUTILS

QQOQCCP, brainstorming, diagramme d'Ishikawa, champ de forces, SWOT, cartographie du projet, objectifs SMART…

PHASE 2
CONSTRUIRE ET PLANIFIER

Phase de **préparation du projet** et de planification des tâches et des activités.

CONSTRUIRE



- Définir les acteurs du projet (chef de projet et contributeurs)
- Lister les tâches
- Définir l'enchaînement logique des tâches
- Identifier les livrables
- Attribuer les ressources
- Valider le cahier des charges
- Identifier les risques

PLANIFIER



- Affecter une durée aux tâches
- Organiser les tâches dans le temps
- Définir les priorités
- Poser les jalons
- Etablir le plan de communication

OUTILS

Entrées-sorties, planning maître, matrice de décision, rétroplanning, GANTT, PERT, matrice d'Eisenhower, matrice des risques…

PHASE 3
CONDUIRE ET PILOTER

Phase de **réalisation du projet** et d'animation de l'équipe projet.

CONDUIRE



- Animer l'équipe projet
- Motiver les équipiers
- Communiquer autour du projet
- Réunions d'avancement et bilans d'étapes

PILOTER



- Contrôler l'avancement
- Analyser les indicateurs de suivi
- Maîtriser les risques
- Mettre en production
- Tester le projet

OUTILS

Tableaux de bord, matrice de compatibilité, matrice des contributeurs, mind mapping, DESC…

PHASE 4
CLÔTURER ET ÉVALUER

Phase de **finalisation du projet** et de capitalisation de l'expérience.

CLOTURER



- Valider le projet
- Livraison de l'ouvrage
- Réunion de clôture
- Etablir la documentation
- Communiquer

EVALUER



- Valider les méthodes et outils utilisés
- Capitaliser l'expérience

OUTILS

Rapport de clôture, roue de Deming (PDCA)…
